


# Empreendimento Platinum - Cronograma Executivo Atividades do Térreo p/ Abertura Apto Decorado - Clientes

Id	Nome da tarefa	Status	Duração	% concluído	Início real	Início	Término real	Término	06/Maio/18								
									D	S	T	Q	Q	S	S	D	
1	<b>Platinum - Término Térreo - Acesso Apto Decorado</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>42 dias</b>	<b>53%</b>	Qui 05/04/18	<b>Qui 05/04/18</b>	<b>ND</b>	<b>Ter 05/06/18</b>								
2	<b>Atividades externas obra - Acesso Clientes</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>30 dias</b>	<b>72%</b>	Seg 16/04/18	<b>Seg 16/04/18</b>	<b>ND</b>	<b>Seg 28/05/18</b>								
5	Modificar Local da Guarita vigia externo á obra		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Seg 14/05/18	ND	Seg 14/05/18								
10	Limpeza geral frente obra dentro do tapume - visão clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluída	1 dia	100%	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18								
11	Nivelamento terreno frente obra do Tapume até andaime fachadeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluída	1 dia	100%	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18								
12	Fechar acessos a Obra Bruta - Lateral esquerda.	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluída	1 dia	100%	Qua 09/05/18	Qua 09/05/18	Qua 09/05/18	Qua 09/05/18								
13	Execução caminho h=1,20 m com tela laranja e proteção superior acesso clientes - Proteção contra quedas de material	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>2 dias</b>	<b>50%</b>	Sex 11/05/18	Sex 11/05/18	ND	Seg 14/05/18								
14	Instalação do quadro com a comunicação visual de andamento do empreendimento e placas de utilização de EPI / Rota de Fuga / contato de emergência - Padrão		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Sex 25/05/18	ND	Sex 25/05/18								
15	Instalação de placas Indicativas onde é Apto Decorado e Engenharia		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Seg 28/05/18	ND	Seg 28/05/18								
16	Instalação Painéis Publicitários Empreendimento no Tapume externo da Obra		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Seg 28/05/18	ND	Seg 28/05/18								
17	<b>Infra Enterrada - Elétr/SPDA - ESG Sanit. E Cx's gordura/ - Esg Pluvial e Drenos</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>27 dias</b>	<b>98%</b>	Qui 05/04/18	<b>Qui 05/04/18</b>	<b>ND</b>	<b>Seg 14/05/18</b>								
23	Proteção contra queda de materiais no acesso de pessoas		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Seg 14/05/18	ND	Seg 14/05/18								
31	<b>Supra Estrutura Térreo (Laje de Contra Piso - CP)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>13 dias</b>	<b>36%</b>	Sex 04/05/18	<b>Sex 04/05/18</b>	<b>ND</b>	<b>Ter 22/05/18</b>								
35	Execução Armadura Lajes CP / Rampas - Verificar Projeto PDV		Tarefa futura	2 dias	0%	ND	Seg 21/05/18	ND	Ter 22/05/18								
36	Inst. Elétricas/Hidross./Ar Cond... - enterradas CP Térreo		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Ter 22/05/18	ND	Ter 22/05/18								
38	Lixação e regularização - Lajes Teto Térreo - PDV		Tarefa futura	4 dias	0%	ND	Ter 15/05/18	ND	Sex 18/05/18								
39	Lixação e regularização - Pilares Térreo PDV		Tarefa futura	2 dias	0%	ND	Qui 17/05/18	ND	Sex 18/05/18								
40	<b>Obras Bruta Térreo - PDV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>15 dias</b>	<b>40%</b>	Sex 04/05/18	<b>Ter 08/05/18</b>	<b>ND</b>	<b>Seg 28/05/18</b>								
42	Execução Instalações Embutidas - Alvenarias (Elet. E Hidross)	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluída	1 dia	100%	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18								
43	Instalação de Contra Marcos - Esquadria Portaria		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Qua 23/05/18	ND	Qua 23/05/18								
44	Reboco Interno faltante (portaria) e demais peças - Arremates		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Seg 14/05/18	ND	Seg 14/05/18								
45	Instalação Esquadria Portaria		Tarefa futura	1 dia	0%	ND	Ter 29/05/18	ND	Ter 29/05/18								
46	<b>Execução Escadaria</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No Prazo</b>	<b>23 dias</b>	<b>18%</b>	Qui 03/05/18	<b>Qui 03/05/18</b>	<b>ND</b>	<b>Ter 05/06/18</b>								
47	Término instalações Elétricas embutidas paredes	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluída	3 dias	100%	Qui 03/05/18	Qui 03/05/18	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18								
48	Arremates Reboco Interno Paredes	<input checked="" type="checkbox"/>	No Prazo	3 dias	67%	Qui 10/05/18	Qui 10/05/18	ND	Seg 14/05/18								



# Empreendimento Platinum - Cronograma Executivo Atividades do Térreo p/ Abertura Apto Decorado - Clientes

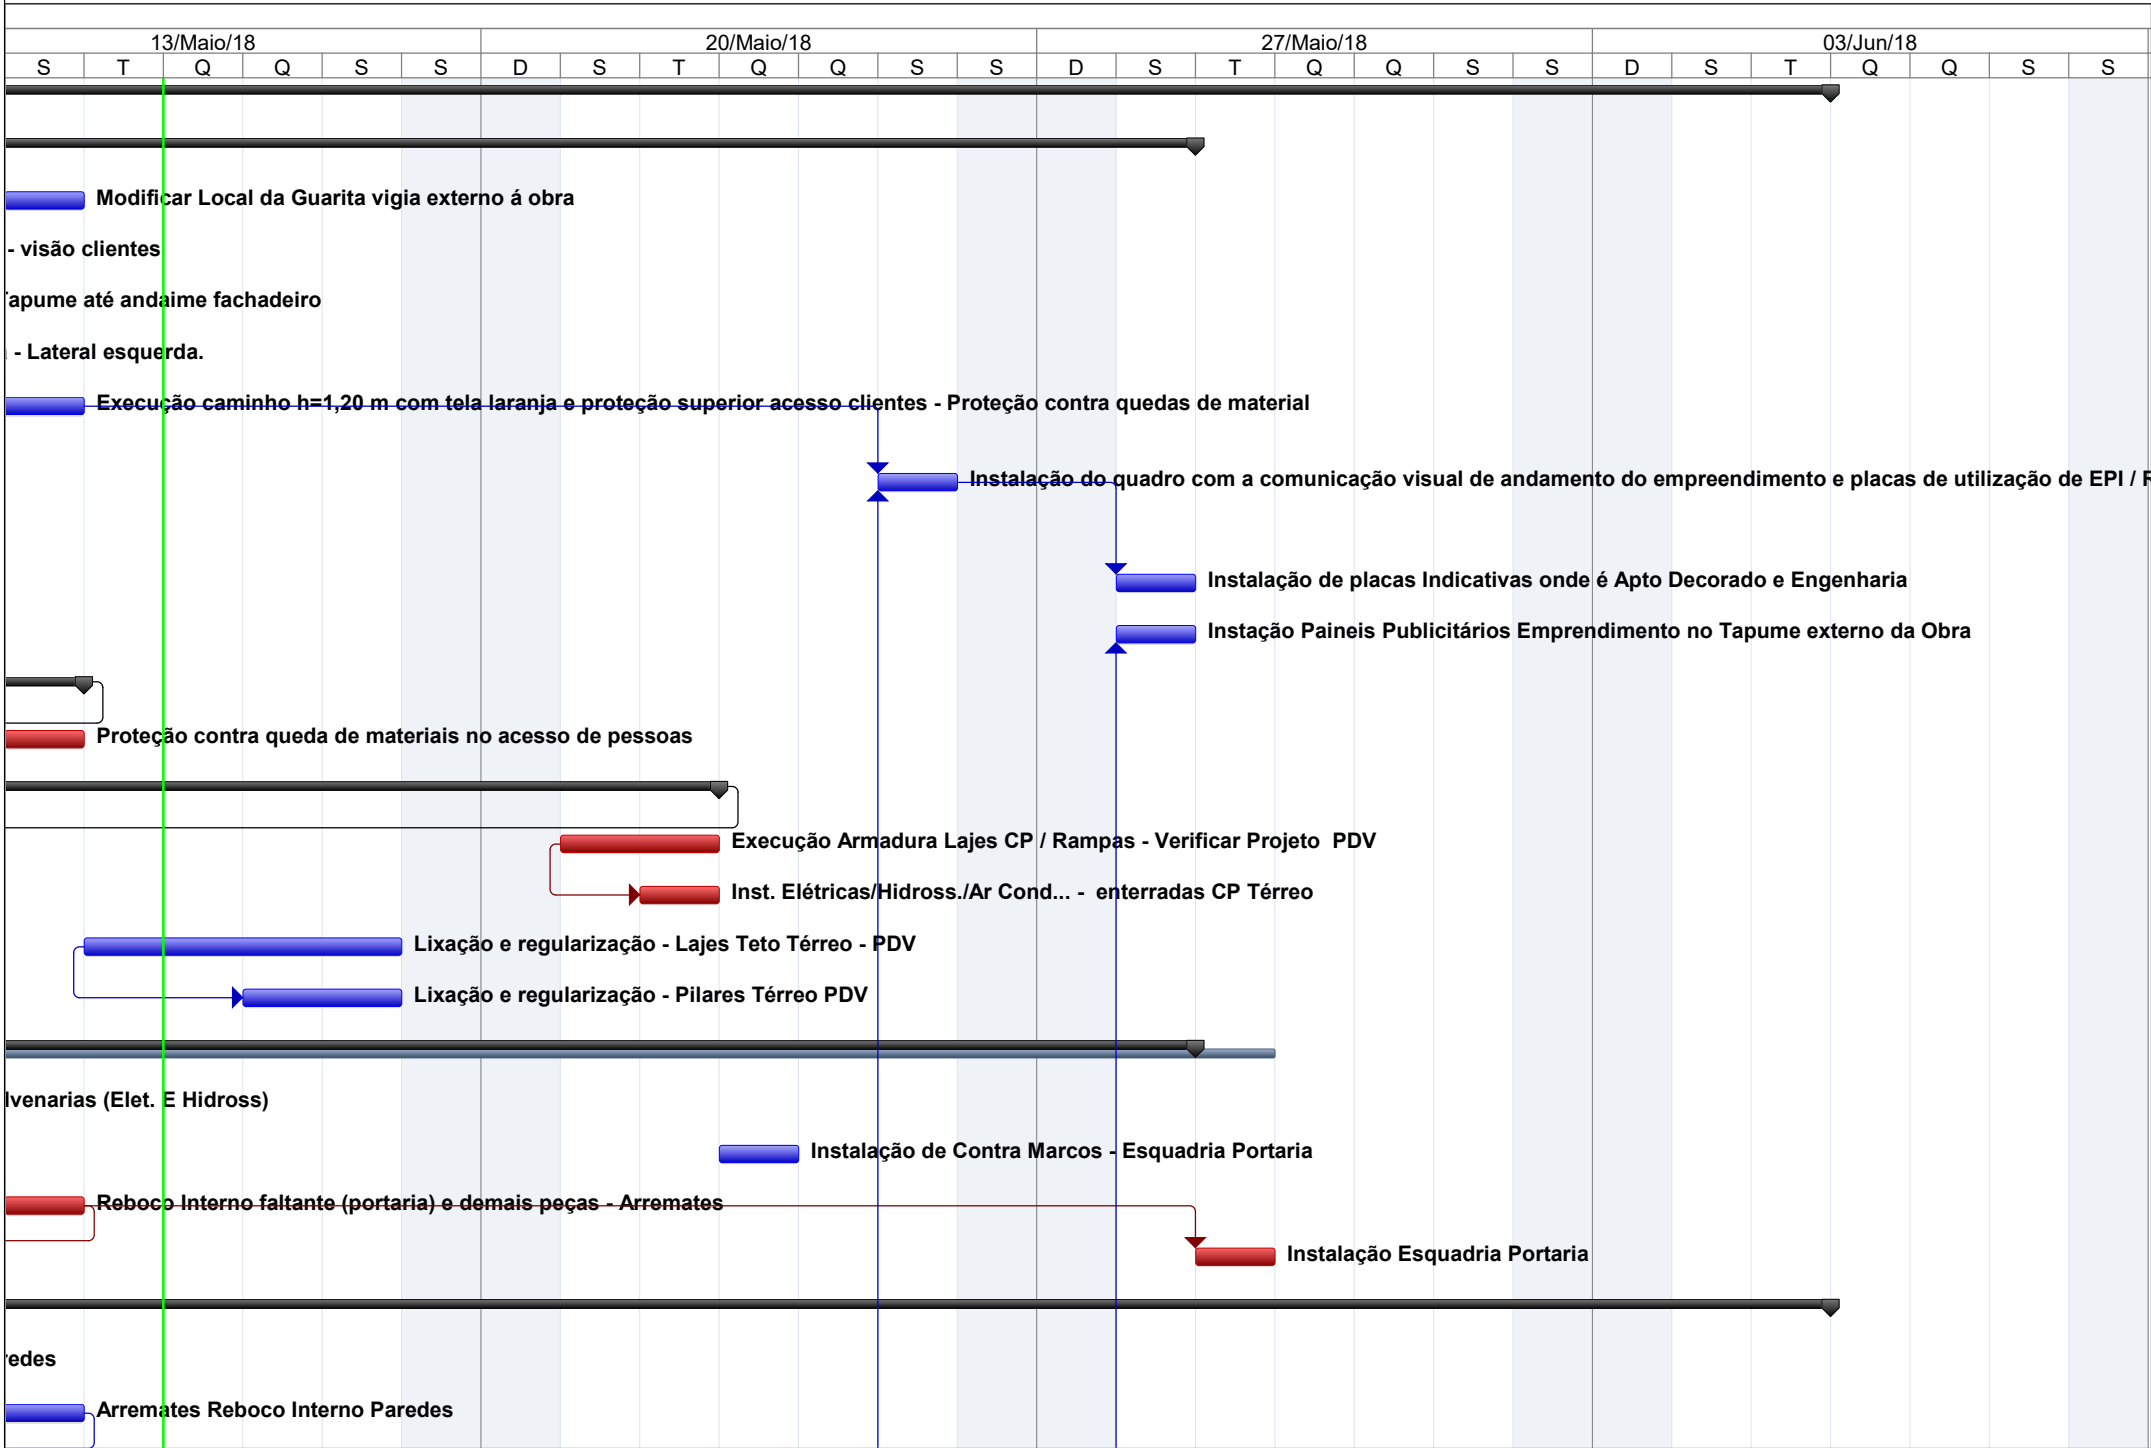

# Empreendimento Platinum - Cronograma Executivo Atividades do Térreo p/ Abertura Apto Decorado - Clientes

